

बार्षिक समिक्षा बैठक


आ.व. ०७१\०७२

मिति: २०७२।०५।०२ गते


पुतलीबजार नगरपालिका कार्यालय
स्याङ्जा

प्रस्तोता :
खगेन्द्र प्रसाद ढकाल

नेपालको नक्शामा स्याङ्जा जिल्ला

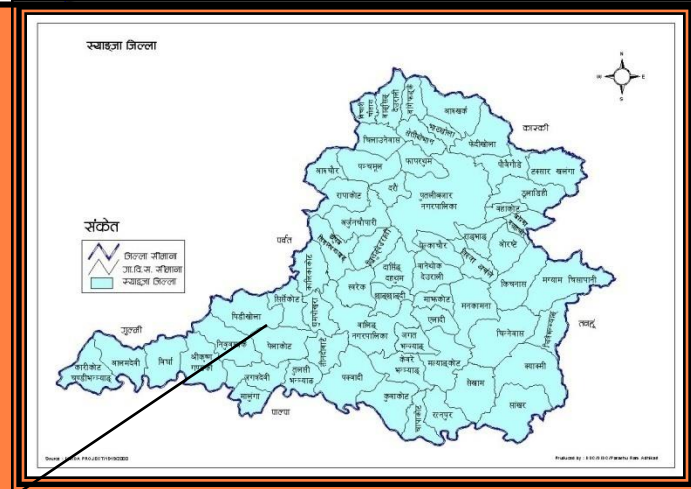

Putalibazar Municipality

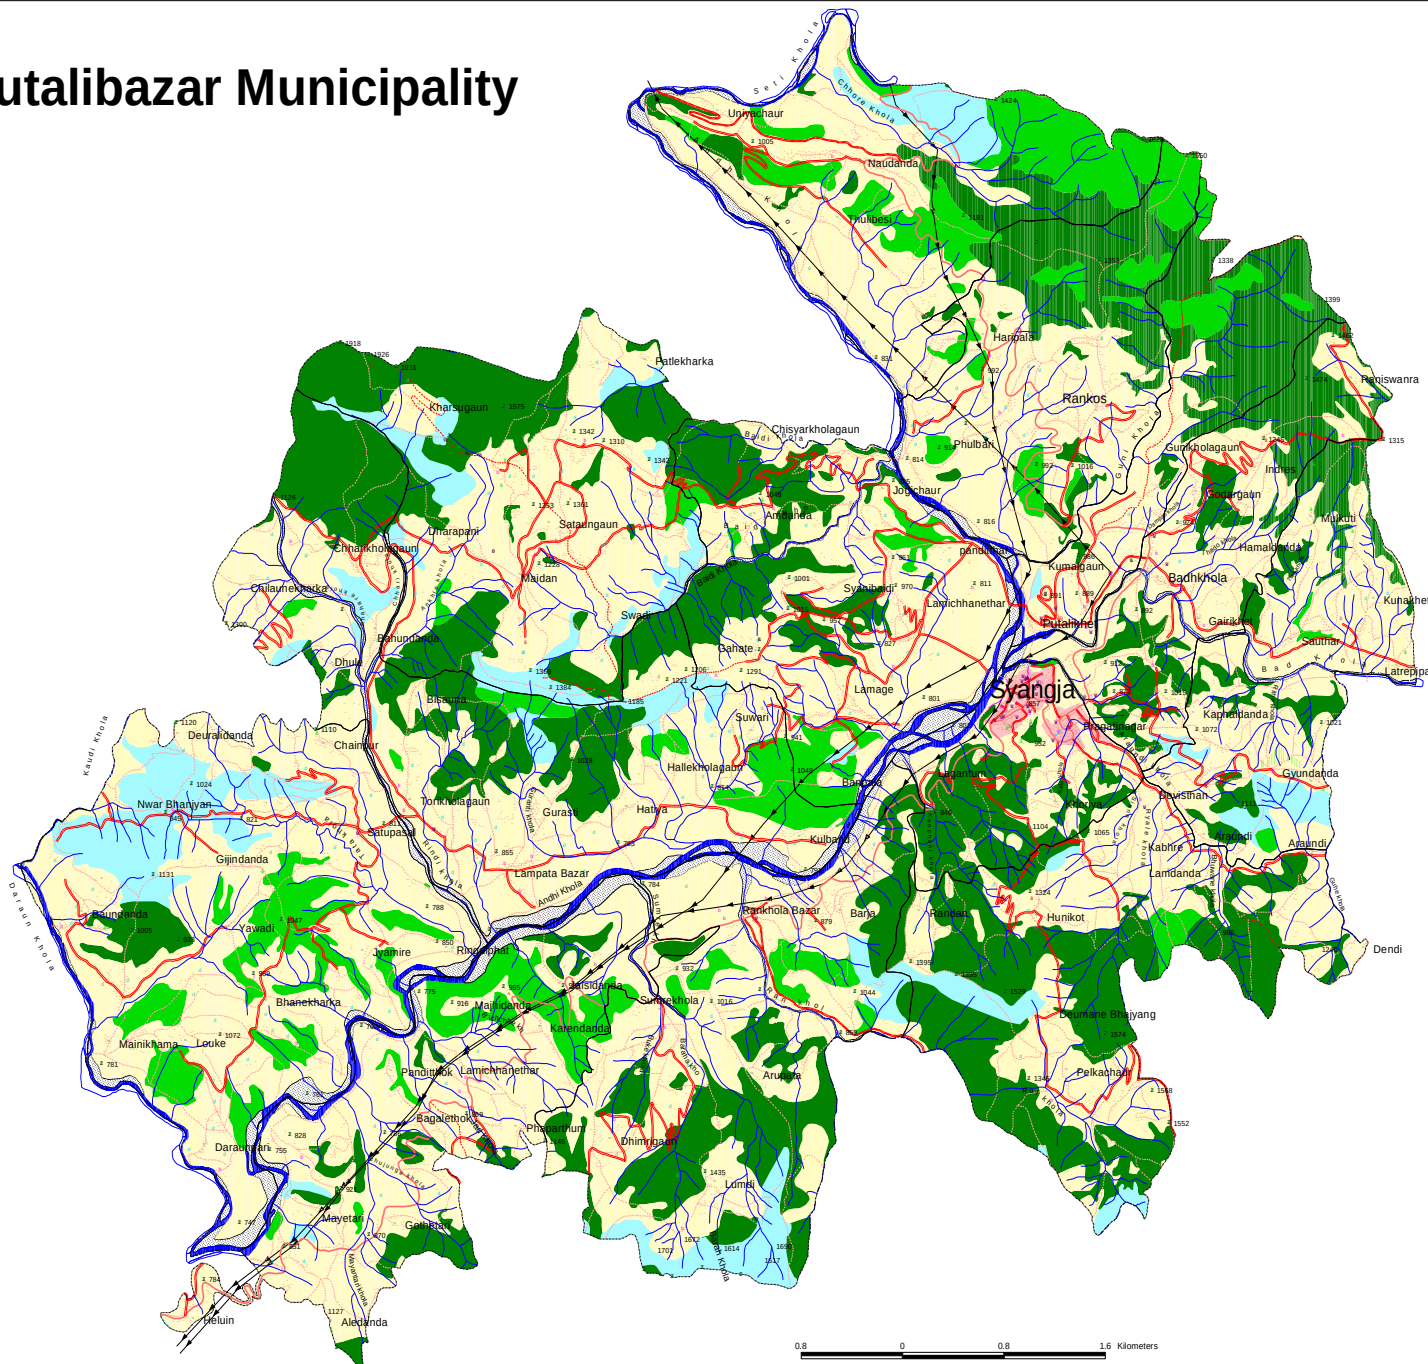

- Legend**
- Building points
 - Tourism area
 - Water tank
 - Water Source
 - Pandhero
 - Dhara
 - Telephone tower
 - Temple
 - Church
 - Gumba
 - Masque
 - Spot light
 - Tama Khani
 - Dhungakhani
 - Gupha
 - Social service institution
 - Chautari
 - School
 - District hospital
 - Ayurbehd hospital
 - Health post
 - Sub health post
 - River
 - Highway
 - Metal road
 - Graveled road
 - Earthen road
 - Cemented stair
 - Cemented trail
 - Main trail
 - Trail
 - Electric line shp
 - Ward boundary
 - Municipal boundary
 - Built up area
 - Cultivated land
 - Dense forest
 - Thin forest
 - Grass land
 - Water body
 - Sand and boulder

0.8 0 0.8 1.6 Kilometers

Source: Topo map 1996 and field survey 2008

१.पुतलीबजार नगरपालिकाको वस्तुस्थिती

१.१ परिचय

स्थापना :- २०५३ साल,

वडा संख्या :- १३

क्षेत्रफल :- ७०.१४ वर्ग कि. मी.

जनसंख्या : - ३०७०४ महिला : १७१५५ पुरुष : १३५४९

घरधुरी संख्या : - ८१८०

भौगोलिक क्षेत्र : - पहाड

सिमाना :- पूर्व : वहाकोट,राङ्गभाङ्ग ,पौवैगौडे र ठुलाडिही गा.वि.स

:- पश्चिम : दरौं र अर्जुनचौपारी गा.वि.स

:- उत्तर : फापरथुम, सेतीदोभान र फेदीखोला गा.वि.स

:- दक्षिण : खिलुङ्गदेउराली, दारसिङ्ग दहथुम र पेल्काचौर

तराइ र पहाड जोड्ने सडक :- सिद्धार्थ राजमार्ग

छिमेकी नगरपालिका :- वालिङ ,चापाकोट र पोखरा उप-महानगरपालिका

उचाई : ७४९ देखि १९३१ मिटर सम्म

हावा पनी : उष्ण र समशितोष्ण हावापानी

प्रमुख जाति : आर्यन (ब्राम्हण ,क्षेत्री दशनामी) ,आदीवासि
जनजाति ,(मगर ,गुरुङ) मुस्लीम र दलित

१.३ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलहरू

- चण्डीस्थान देवीको मन्दिर तथा पार्क वडा नं. ८ सतौं,
- शितलादेवी मन्दिर , वडा नं. १० गोरुजुरे,
- शिव मन्दिर वडा नं. ६ गुडीखोला, र वडा नं.९ लामागे
शिव मन्दिर वडा नं. ६ विरुवा
- नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र डाँडाकाँडा, हरियाली,
आँधीखोला र त्यसको फाँट ,
खर्सुलेक वडा नं. १
- भालुपहाड शहिद पार्क ।
- आँधीखोला, अरौंदी र बाडखोलाको प्रवाह क्षेत्र आदि ।


१. वित्तिय प्रगति विवरण

आ.व. २०७१।७२

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम / परियोजना / अनुदान र आन्तरिक आय	विनियोजित बजेट			यथार्थ निकास			यथार्थ खर्च			खर्च प्रतिशत			जिम्मेवारी सरेको रकम
		पूजिगत	चालु	जम्मा	पूजिगत	चालु	जम्मा	पूजिगत	चालु	जम्मा	पूजिगत	चालु	जम्मा	
1	नगरपालिका अनुदान	12691	0	12691	12691	0	12691	12691	0	12691	100	0	100	
2	स्थानीय विकास शुल्क	5200	5320	10520	3980	5070	9050	3980	5070	9050	44	56	100	
	शसर्त अनुदान													
3	स्थानीय शासन सामुदायीक विकास कार्यक्रम	200	6471	6671	200	6471	6671	200	6471	6671	3	97	100	
4	जगेडा कोष कार्यक्रम	24063	0	24063	24063	0	24063	21437	0	21437	89	0	89	२६२६
5	सडकबोर्ड नेपाल	2500	0	2500	1055	0	1055	0	0	0	0	0	0	१०५५
6	सि टि नेट	0	490	490	0	490	490	0	244	244	0	50	50	२४६
7	शहरी स्वास्थ्य किल्लीक	0	624	624	0	605	605	0	605	605	0	100	100	
8	शान्ति तथा पून निर्माण	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	100	100	
9	बाल संरक्षण अनुदान	0	1080	1080	0	1080	1080	0	0	0	0	0	0	१०८०
10	जि वि स अनुदान कार्यक्रम	400	0	400	400	0	400	240	0	240	60	0	60	१६०
11	आन्तरिक आय	0	7100	7100	0	6345	6345	0	6345	6345	0	100	100	०
12	मालपोत रजिष्टेशनबाट प्राप्त	2350	0	2350	2350	0	2350	2350	0	2350	100	0	100	०
13	उपभोक्ता नगद सहभागिता	9574	0	9574	9574	0	9574	9574	0	9574	100	0	100	०
	कुल जम्मा	56978	21130	78108	54313	20106	74419	50472	18780	69252	93	93	93	५१६७

■ कुल बजेट ■ निकास ■ खर्च

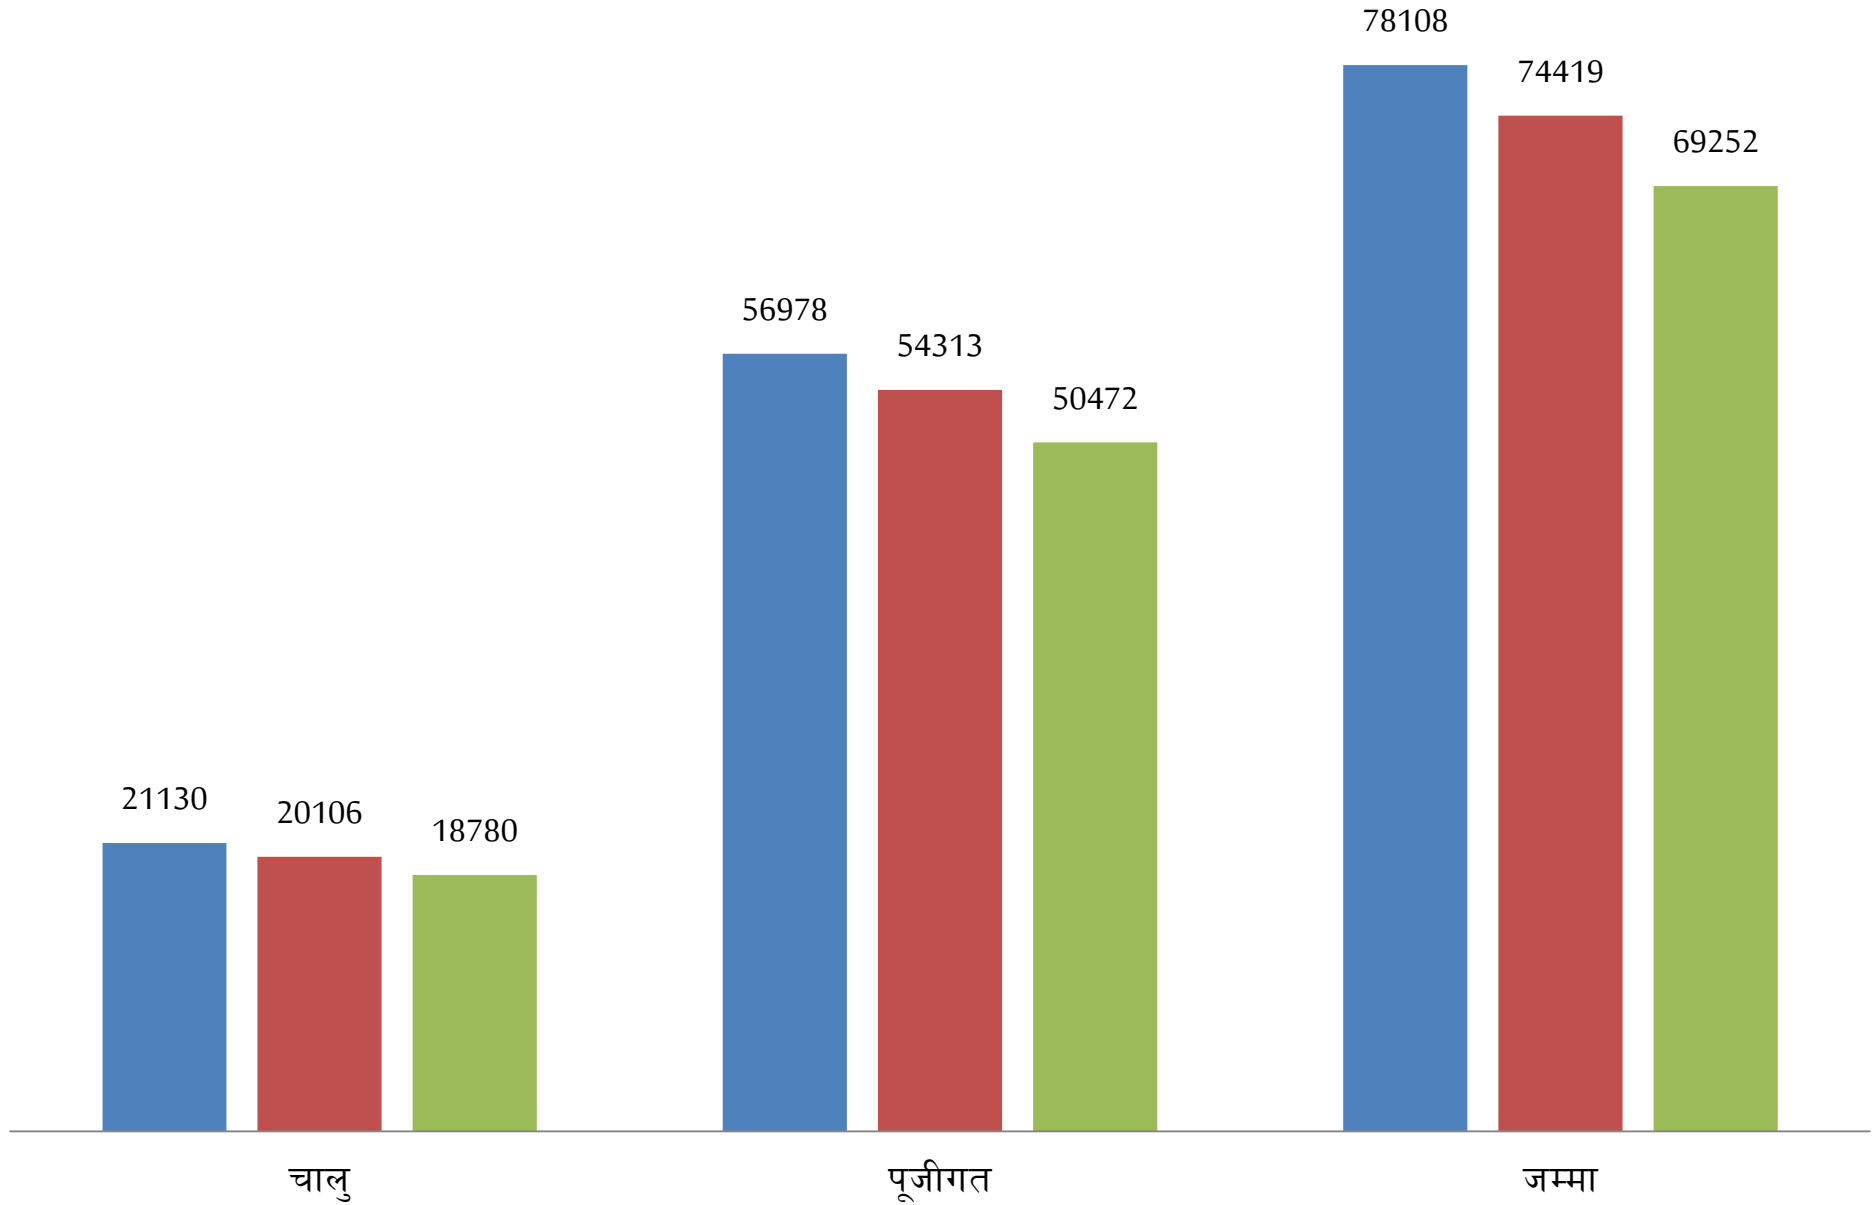

वित्तीय प्रगती विवरण

रु हजारमा

अनुमानित बजेट

चालु : २११३०

पुजीगत : ५६९७८

कुल जम्मा : ७८१०८

निकासा

चालुगत : २०१०६

पुँजीगत : ५४३१३

कुल जम्मा : ७४४१९

खर्च

चालुगत : १८७८०

पुजीगत : ५०४७२

कुल जम्मा : ६९२५२

निकासाको तुलनामा वित्तिय प्रगति : ९३%

मौज्दात :

चालु: १३२६

पुजीगत : ३८४१

जम्मा रु : ५१६७

(१) बेरुजु

रु. हजारमा

विवरण	आ व २०६९।७० सम्मको वेरुजु	२०७०।७१ को बेरुजु	जम्मा वेरुजु	०७०।७१ सम्मको फछ्रोँट			फछ्रोँट प्रतिश त	बाँकी वेरुजु
				म.ले.प. बाट	समिति बाट	जम्मा		
केन्द्रीय	०	०	०	०	०	०	०	०
आन्तरिक	५०	०	५०	०	०	०	०	५०
जम्मा	५०	०	५०	०	०	०	०	५०

(२) पेशकी

रु. हजारमा

विवरण	साविक गा वि स को	नगरपालिका		जम्मा पेशकी
		आ व २०६९।७० सम्मको	आ व २०७०।७१ को	
केन्द्रीय बजेट तर्फको	1171	58	15	1244
आन्तरिक बजेट तर्फको	0	0	0	0
जम्मा	1171	58	15	1244

नगरपालिका अनुदान तर्फ भौतिक तथा वित्तिय
प्रगति
पुर्वाधार विकास तर्फ
रु.हजारमा

वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	प्रगति	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
5134	4891	95	109	105	96

भौतिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	मुख्य गतिविधि	इकाई	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	प्रगती प्रतिशत
1	सडक	शिकि मी नयाँट्याक ग्राभेल, ग्याविन टेवा नाला, कल्भट ,हुमपाईप कल्भट	वटा	37	36	97
2	खानेपानी तथा सरसफाई	टंकी, पाईपा, धारा , कुवा शौचालय	वटा	30	29	97
3	ढल तथा नाला	नाला निर्माण	वटा	2	2	100
4	कल्भट	मोटरलेभल कल्भट	j^f	2	2	100

भौतिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	मुख्य गतिविधि	इकाई	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	प्रगती प्रतिशत
1	सिचाई	पक्की सिचाई कुलो निर्माण	वटा	24	24	100
2	पर्यटन पूर्वाधार	पक्की गोरेटो घोडेटो बाटो निर्माण	वटा	3	3	100
3	भवन निर्माण	वडा कार्यालय	वटा	1	1	100
4	तटबन्धन	खोला नदी नियन्त्रण	j^f	4	4	100
5	वतावरण तथा सरसफाई	सार्वजनिक शौचलय	j^f	4	1	25

लक्षित समुहका लागि
महिलाका लागि योजना तथा कार्यक्रम लागि
रु हजारमा

वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	प्रगति	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
1316	1249	95	41	38	9\3

कार्यक्रमको विवरण	मुख्य गतिविधि	ईकाइ	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत
बाटो निर्माण तथा मर्मत	सडक, गोरेटो , धाडेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत	वटा	2	2	100
खानेपानी मर्मत संभार	ईन्टेक , आर भि टि, पाईप , धारा ,र मर्मत संधार	वटा	1	1	75
भवन	आमा समुह, टो वि स भवन निर्माण	वटा	12	12	100
क्षमता विकास कार्यक्रम	स्वास्थ्य, उद्योषण, सरसफाई, महिला सचेतना , महिलाहरुको क्षमता विकास ,एकल महिला, महिला शसक्तिरण कार्यक्रम	वटा	9	8	89

कार्यक्रमको विवरण	मुख्य गतिविधि	ईकाइ	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत
आर्थिक सिप विकास	सिलाई कटाई,तरकारी तथा फलफुल खती, विउ विजन, मौरी, बाख्रा पालन कार्यक्रम तथा तालिम	वटा	12	2	100
संस्थागत विकास	एकल महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवीका प्रशती कक्षका लागि उपकरण स्टेचर खरीद	वटा	17	17	100

बालबालिका लागि

रु हजारमा

वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	क/वर्ष	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
1316	1222	93	36	33	92

वालबालिका लागि योजना तथा कार्यक्रम

कार्यक्रमको विवरण	मुख्य गतिविधि	ईकाइ	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत
विद्यालय भवन तथा मर्मत संभार	विद्यालय भवन मर्मत संभार	वटा	9	9	100
खेलकुद विकास	खेल मैदान निर्माण, खेलकुद सामाग्री बाल उद्यान	वटा	3	3	100
सामाजिक संस्थागत विकास	बल कल्ब, बाल विकास बाल हिंसा, मातृ शिशु स्वास्थ्य बाल पोषाक कम्प्युटर वितरण लागु पदार्थ दुर्वेशनि नियन्त्रण, अपाङ्गता साकेतिक भाषा, मर्दशा कक्षा संचालन, शिप मलक तालिम अपाङ्गता विषय कार्यक्रम	वटा	24	21	87

आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछ्छडिएकाबर्गका लागि

वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	k ult	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
1974	1754	89	43	38	88

आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका पिछ्छडिएकाबर्गका योजना तथा कार्यक्रम लागि

कार्यक्रमको विवरण	मुख्य गतिविधि	ईकाइ	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत
सडक तथा बाटो	सडक मर्मत संभार पक्कि नाला कल्भट निर्माण	वटा	4	4	100
खानेपानी तथा सरसफाई	टंकी, पाईप धारा खानेपानी मर्मत संधार	वटा	5	5	100
वातावरण	शैचालय र कर्वस्थान निर्माण	वटा	6	4	100
भवन	सामुदायीक भवन नि तथा मर्मत	वटा	4	4	100
नला तथा ढल	मौरी, बाख्रा र नर्सरी कार्यक्रम	वटा	2	2	100

कार्यक्रमको विवरण	मुख्य गतिविधि	ईकाइ	लक्ष्य संख्या ।	प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत
अन्य		वटा	3	3	100
सामाजिक क्षमता विकास		वटा	7	5	71
आर्थिक सिप विकास		वटा	12	11	91

प्रर्वद्धनात्मक क्षेत्रका लागि

रु हजारमा

वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	k ult	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
3423	2600	76	19	13	68

प्रर्वद्धनात्मक क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रम लागि

कार्यक्रमको विवरण	मुख्य गतिविधि	ईकाइ	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत
विभिन्न कार्यक्रम		वटा	19	13	68

ग्रहक बोर्ड नेपाल

वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	प्रगति	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
1055	0	0	4	0	0

क्रियाकलाप :

जगोडाकोष कार्यक्रम

वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	प्रगति	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
24063	21437	89	7	5	71

क्रियाकलाप : ग्यारेज तथा गाडेन, १.६ कि मी कालोपत्रे
सडक विस्तार १.२ कि मी नाला, ५ वटा पाईप कल्भट १ वटा
कजवे, ग्याविन टेवा पर्खाल र मेसनरी टेवा पर्खाल

स्थानीय शासन सामुदायीक विकास कार्यक्रम

वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
लक्ष्य	प्रगति	%	लक्ष्य संख्या	प्रगति संख्या	%
1890	1790	95	6	6	100

क्रियाकलाप : १५ वटा धारा, ३ टंकी १.४ कि मी. पाईप ३० वटा सुधारीयका चुलो र शौचालय , १० वटा बाख्राको खोर निर्माण,

४.२ सामाजिक परिचालन तर्फ

- सामाजिक परिचालन लागु भएका वडा संख्या :-१ देखी १३
- परिचालन भएका वडा नागरिक मंच संख्या : -१३
- गठन भएका वडा नागरिक मंच संख्या :-१३
- वडा नागरिक मंचमा सहभागि संख्या :-३३०
- नागरिक सचेतना केन्द्रको संख्या :-६
- नागरिक सचेतना केन्द्रमा सहभागि संख्या :-१८०

५. आन्तरिक आयको अवस्था

रु हजारमा

श्रोतहरु	०६९।७०को यर्थाथ आय	०७०।७१को यर्थाथ आय	०७१।७२को अनँमानित आय	०७१।७२को यर्थाथ आय
एकिकृत सम्पत्तीकर	1639	2254	2200	2085
व्यवसाय कर	244	1044	600	550
नक्सापास	604	569	1000	662
सिफारिस तथा बक्सौनी दस्तुर	415	1030	300	758
नाता प्रमाणीत	49	128	100	194
सम्पत्ती म'ल्याङ्कन	62	456	300	592
अन्य सिफारिस	649	794	2600	1495
जम्मा रु	3662	6275	7100	6345
मालपोत रजिष्ट्रेशन	1886	1972	2350	2350

द. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम :

लक्षित वर्ग	गत आ.व. ०७१ । ७२को लगतकट्टा संख्या	भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या	वितरित रकम	पेस्की बेरुज रकम
जेष्ठ नागरिक अन्य	46	1536	a}s dfkm{t	0
जेष्ठ नागरिक दलित	16	410	वितरण	0
एकल महिला	21	756		0
पुर्ण अपाङ्ग	0	50		0
आंसिक अपाङ्ग	0	71		0
बाल संरक्षण	55	500	0	0
जम्मा	138	3071		0

९.पन्जिकरण विवरण

व्यक्तिगत घटना	दर्ता संख्या०७१ बैशाख देखि ०७१चैत्र सम्म	बृद्धि संख्या प्रतिशत
जन्म महिला	678	
जन्म पुरुष	734	
मृत्यू महिला	125	
मृत्यू पुरुष	145	
विवाहदर्ता	482	
वसाईसराई गएको संख्या	135	
वसाईसराई आएको परिवार	296	
सम्बन्ध विच्छेद	5	
जम्मा	2600	3.1k ltzt

पुर्वाधारको अवस्था

१. सडक

क. कालो पत्रे सडक

गत आ व सम्म कि.मी.	यस आ.व. मा थप कि.मी.	जम्मा कालो पत्रे सडक कि.मी.
18.18	1.66	19.84

ख) ग्राभेल सडक

गत आ व सम्म कि.मी.	यस आ.व. मा थप कि.मी.	जम्मा कालो पत्रे सडक कि.मी.
20.84	.5	21.34

ग) माटे सडक

गत आ व सम्म कि.मी.	यस आ.व. मा थप कि.मी.	जम्मा कालो पत्रे सडक कि.मी.
114.5	3.35	117.85

,२. सिचाई (क्षे. फ. हेक्टरमा)

गत आ व सम्म सिंचित क्षे.फ. हेक्टर	यस आ.व. मा थप सिंचित क्षे.फ.हेक्टर	जम्मा सिंचित क्षे.फ. हेक्टर
85.3	13	98.3

पुर्वाधारको अवस्था

३. खानेपानी

गत आ व सम्म धारा / ट्यांकी निर्माण	यस आ.व. मा थप धारा / ट्यांकी निर्माण	जम्मा धारा र ट्यांकी निर्माण
wf/f 120 ^\ofsL 111	wf/f 18 ^\ofsL 15	wf/f 138 ^\ofsL 126

४. भो. पु

गत आ. व. सम्म सम्पन्न भो पु संख्या	यस आ. व. मा थप सम्पन्न भो पु संख्या	जम्मा सम्पन्न भो पु संख्या
1	0	1

५. नाला कि मी

गत आ.व. सम्मको नाला निर्माण	यस आ.व. माथप नाला	जम्मा नाला निर्माण
16.87	1.71	18.58

६. भवन निर्माण

गत आ.व. सम्म न पाले निर्माण गरेका भवनको संख्या	यस आ.व. मा निर्माण भवन आदिको संख्या	जम्मा निर्माण सम्पन्न विद्यालय/ सामुदायीक भवन आदिको संख्या
41	9	50

७. ग्रामिण विद्युतीकरण

गत आ.व सम्म विद्युतिकरण कि. मी	यस आ.व मा विद्युतिकरण कि. मी	जम्मा विद्युतिकरण कि. मी
20	0	20
ढल निर्माण		
गत आ.व सम्म ढल निर्माण कि मी	यस आ.व मा ढल निर्माण कि. मी	जम्मा ढल निर्माण कि. मी
2	0	2

योजनाशाखा बाट सम्पादन गरिएका कामको विवरण

क्र. सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
1	चारकिल्ला प्रमाणीत	679	
2	घरबाटो सिफारिस	526	
3	विद्युत सिफारिस	225	
4	घरकायम	105	
5	नक्सा पास	69	
6	विविध सिफारिस	215	

आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन अवस्था

- सबै योजना उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्था मार्फत संचालन भएको
- सबै योजनामा अनुगमन समिति गठन भएको
- मर्मत संभार समिति गठन भएको
- योजना पुस्तिका भएको
- सार्वजनिक परिक्षण गरिएको
- योजनाहरुमा समावेशी उ. स. भएको
- नगर स्तरीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन भई अनुगमन भएको
- जांचपास समिति बाट सिफारिसपछि भुक्तानी गरिने
- मर्मत संभार कोषको स्थापना गरि मर्मत संभार गरिएको

मुख्य उपलब्धीहरु :

- टोल विकास संस्थाहरु मार्फत कार्यक्रम संचालन गर्दा विकासमा सकारात्मक प्रभाव परेको .
- कच्चीसडकहरुको क्रमश स्तरोन्नती गरिएको
- नाला बिस्तार
- पूर्णसाक्षर नगर घोषणा गरिएको
- भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनमा ल्याईएको
- सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक लगत कायम गरिएको
- न्यूशकास मा ७० अंक ल्याई २६ औं स्थानमा १० प्रतिशत अनुदान थप प्राप्त हुने

मुख्य समस्याहरु

- जनसहभागितामा कठिनाई
- अनुत्पादक क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बढि रकम खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता
- नगरपालिकाको आन्तरिक आय कम भएकाले योजनाको अत्याधिक माग लाई सम्बोधन गर्न नसकिएको
- सडकमा गाडी धुने , पानी फाल्ने, निर्माण सामग्री राख्ने, नाला तथा ढलमा खानेपानीका पाईप लाईन विच्छाउने जस्ता कार्यले गर्दा नगरलाई सुन्दर नगर बनाउन नसकिएको

मुख्य समस्याहरु

- आन्तरिक आय कम हुदा समपुरक कोष राख्न नसकिएको
- कच्ची सडक निर्माणको होडबाजी
- भु क्षय रोकथाम
- ल्याण्ड फिल्ड साईट
- बधशाला
- खानेपानी पाईप व्यवस्थापन
- ढल निकास
- सडक बत्ती
- नियमीत मर्मत संम्भार
- दमकल संचालन र व्यवस्थापन
- विपत व्यवस्थापन
- अव्यवस्थित घर निर्माण

समाधानका उपाय

- अत्यावश्यक बाहेक नयाँ ट्याक खोल्नका लागि निरुत्साहीत गर्ने
- उपभोक्ताबाट नयाँ ट्याक खोल्नका लागि वडा कार्यालय, न. पा., जि. प्रा. का., सडक डिभिजनबाट स्वीकृती लिन लगाउने
- नयाँ योजना भन्दा अधुरा योजना लाई प्राथमिकिकरणमा राख्नुपर्ने
- मर्मत संभारमा जोड दिनुपर्ने ढल तथा नालामा भएका पाईप लाईन व्यवस्थित गराउने
- ढल तथा नाला नियमित मर्मत संभार गर्ने
- सडक तथा पेटिमा सामाग्री राख्ने लाई कारवाही गर्ने
- प्रगती विवरणका फारमहरुमा एकरूपता हुनुपर्ने
- आवधिक योजनामा समावेश भएका योजना तथा कार्यक्रमलाई
- प्राथमिकता दिने

केही भल कहरु

पुतलीखेत उनियांचौर सडक निर्माण कार्यपुर्व



पुतलीखेत उनियांचौर सडक
निर्माण कार्य पश्चात



बर्जा सडक निर्माण कार्य पश्चात




विफे ठुलापधेरा सडक निर्माण कार्य पश्चात



कालाखोला कंकृत सडक निर्माण पश्चात



गुडिखोला गांउ कंकट सडक निर्माण पश्चात

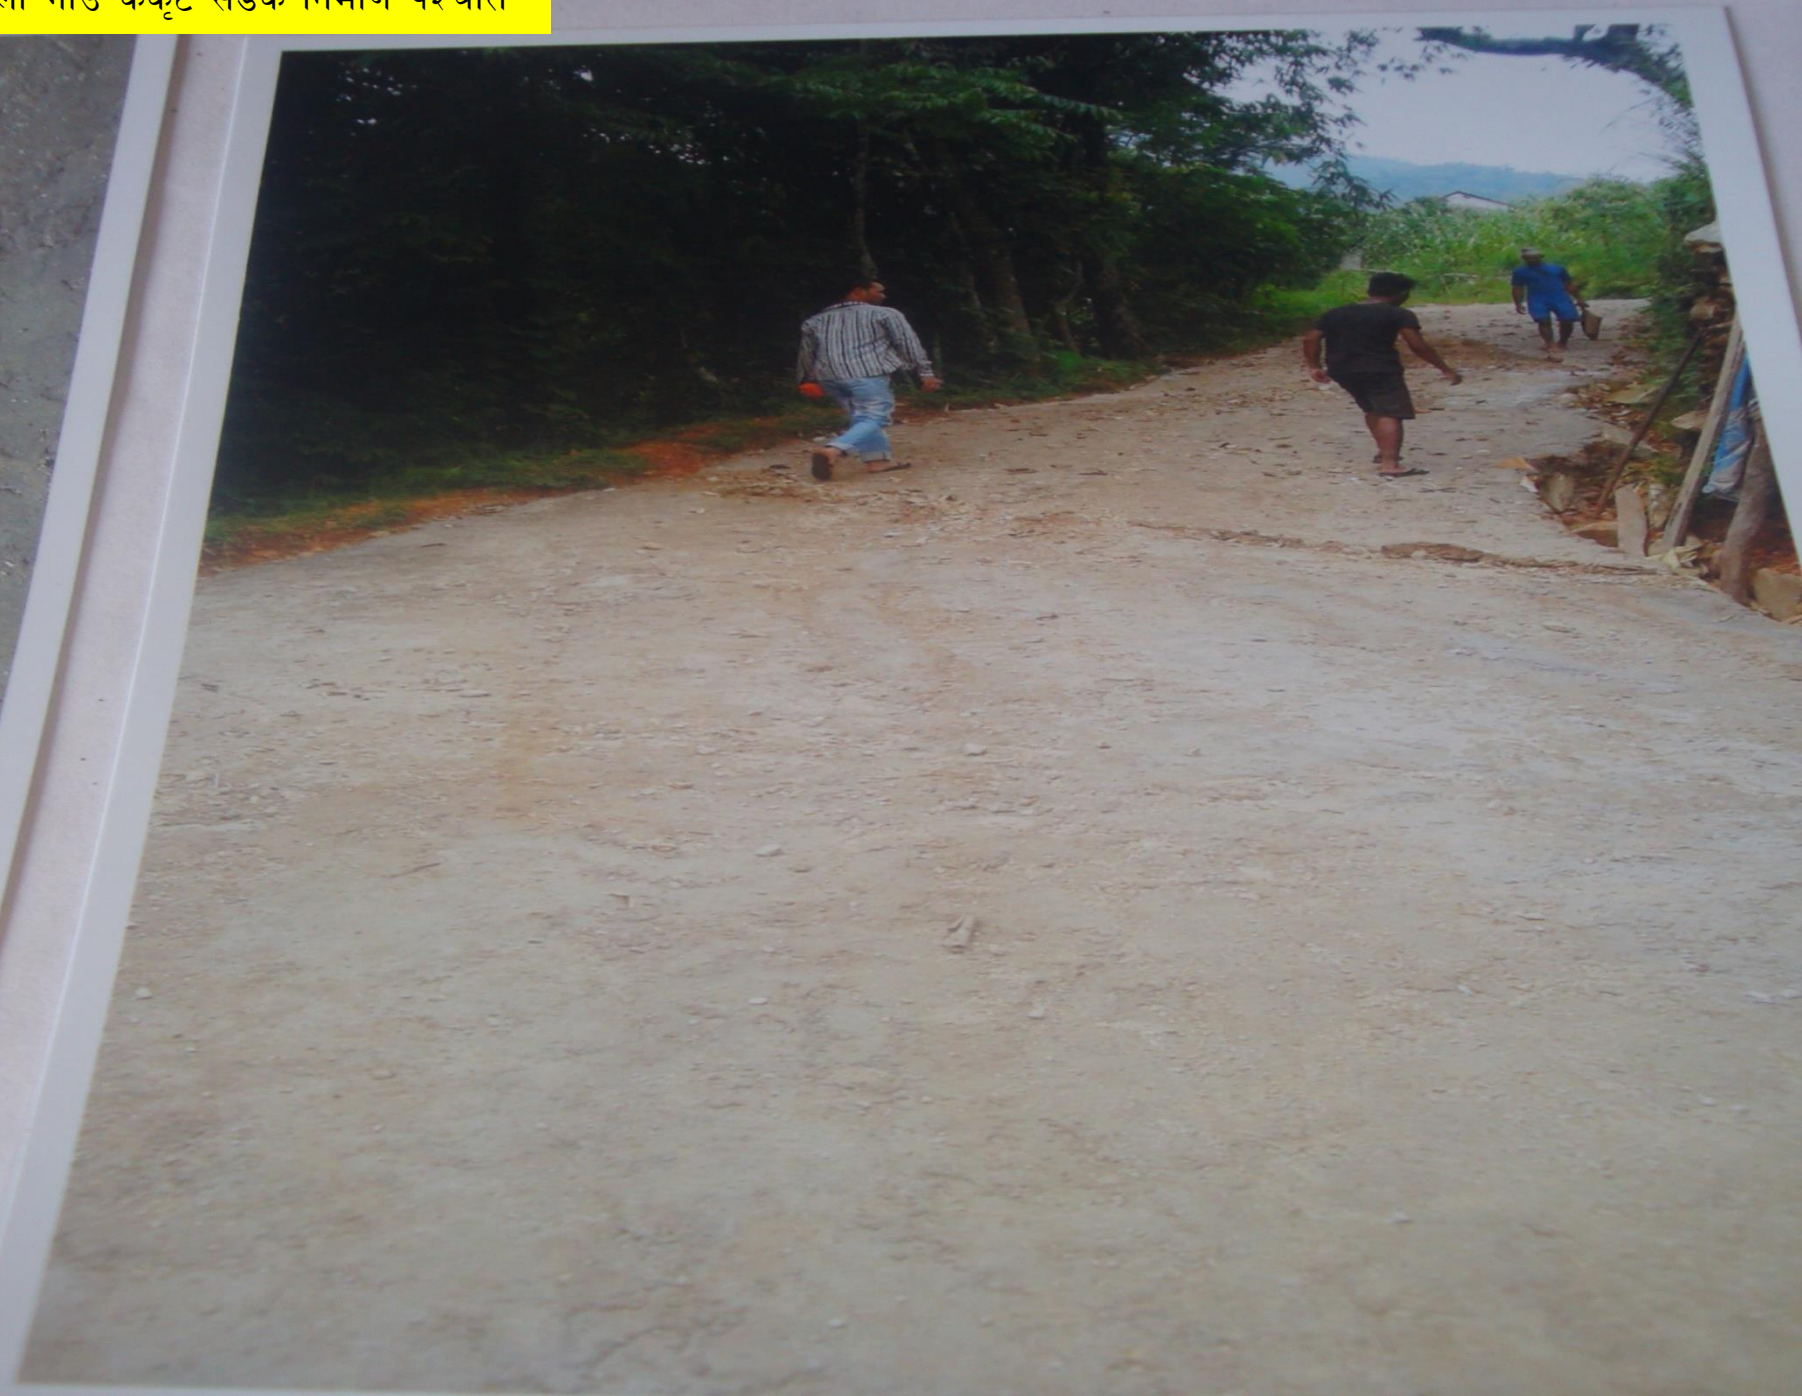

कार्यालय प्रमुख योजना अनुगमन गर्दै



कार्यालय प्रमुख योजना अनुगमन गर्दै



अनुगमन समिति योजना निरिक्षण गर्दै



खानेपानी योजनाको टंकी निर्माण



धारा निर्माण



खानेपानी योजनाको पाईप लाईनको कार्य हुदै



९ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य हुदै



काग सम्पत्ति पट्टि /



वडा नं.२ सूचना केन्द्र भवन निर्माण



पर्यटन विकासका लागि

कमिडुलो र भुवनेश्वर पर्यटकीय स्थल सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रम - २०७२

स्थलगत अवलोकन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
पुतलीबजार नगरपालिका-२
स्याङ्जा



सहयोग
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा

आयोजक
दुर्गादेवी सामुदायिक अध्ययन केन्द्र
पु.ब.म.पा-२ देवीस्थान
स्याङ्जा

वडा नं.६ मा पर्यटन विकासका लागि पूर्वधार निर्माण



सिचाई कुलो निर्माण





सुधारिएको चुलो तथा जुठेल्लो सुधार निर्माण



वडा नं. २ बाखा पालनका लागि खोर निर्माण





Municipality website :

WWW.putalibazarmun.gov.np

E-mail : municipalityputalibazar@yahoo.com

धन्यवाद
